

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月12日

計画の名称 安心・安全な公共下水道事業計画の推進（防災・安全）													
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）												
交付対象	田原市												
計画の目標	下水道施設の長寿命化、浸水対策（津波・高潮）、地震対策（耐震化）を図ることにより、より安心・安全に公共用水域の水質改善を図り、快適な市民生活を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,121	A	1,121	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

計画の成果目標（定量的指標）												
番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値										
		当初現況値		中間目標値		最終目標値						
		H26当初		H28末		H30末						
1	下水道施設（処理場・ポンプ場）における長寿命化対策実施率を0%(H26)から100%(H30)に増加させる。 下水道施設（処理場・ポンプ場）における長寿命化対策実施率 ＝長寿命化対策実施済みの処理場・ポンプ場における設備数／長寿命化対策を実施すべき処理場・ポンプ場における設備数			0%		40%		100%				
2	下水道施設（処理場・ポンプ場）における浸水対策（津波・高潮）実施率を0%(H26)から100%(H30)に増加させる。 下水道施設（処理場・ポンプ場）における浸水対策（津波・高潮）実施率 ＝浸水対策（津波・高潮）実施済みの処理場・ポンプ場における設備数／浸水対策（津波・高潮）を実施すべき処理場・ポンプ場における設備数			0%		50%		100%				
3	下水道施設（処理場・ポンプ場）における耐震化実施率を0%(H26)から80%(H30)に増加させる。 下水道施設（処理場・ポンプ場）における耐震化実施率 ＝耐震化実施済みの処理場・ポンプ場の数／耐震化を実施すべき処理場・ポンプ場の数			0%		20%		80%				

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果	備考	下水道	一般	田原市	直接	田原市	ポンプ場	改築	田原排水区（ポンプ場） （改築更新）	原動機ほか改築更新（設備数 60）	田原市	H26	H27	H28	H29	H30	481		策定済
下水道事業	A07-001	長寿命化																			
		下水道	一般	田原市	直接	田原市	終末処理場	改築	田原処理区（処理場・ポンプ場） （改築更新）	汚水ポンプほか改築更新（設備数128）	田原市								299		策定済
		長寿命化																			
		下水道	一般	田原市	直接	田原市	ポンプ場	改築	田原排水区（ポンプ場）	浸水対策（津波・高潮）	田原市								25		—
A07-003																					
	下水道	一般	田原市	直接	田原市	終末処理場	改築	田原処理区（処理場・ポンプ場）	浸水対策（津波・高潮）	田原市	H26	H27	H28	H29	H30	58		—			
A07-004																					
	下水道	一般	田原市	直接	田原市	ポンプ場	改築	田原排水区（ポンプ場）	地震対策（耐震化）	田原市	H26	H27	H28	H29	H30	241		—			
A07-005																					
	下水道	一般	田原市	直接	田原市	ポンプ場	改築	田原排水区（ポンプ場）	地震対策（耐震化）	田原市	H26	H27	H28	H29	H30	0		—			
A07-006																					
	下水道	一般	田原市	直接	田原市	終末処理場	改築	田原処理区（処理場・ポンプ場）	地震対策（耐震化）	田原市	H26	H27	H28	H29	H30						

A 基幹事業		番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況				
基幹事業 (大)	下水道事業		A07-007	下水道	一般	田原市	田原市	田原市	終末処 理場	改築	赤羽根処理区 (処理場)	浸水対策 (津波・高潮)	田原市	H26	H27	H28	H29	H30	0	-				
			A07-008	下水道	一般	田原市	田原市	田原市	直接	田原市	終末処 理場	改築	渥美処理区 (処理場)	浸水対策 (津波・高潮)	田原市	■						17	-	

事後評価		
○事後評価の実施体制、実施時期		
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期	
田原市水道部下水道課	事業完了後 令和2年3月	
	公表の方法	
	市ホームページ	
○事業効果の発現状況		
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・長寿命化対策を実施し、施設の持続的な管理・運営が図られた。 ・処理場・ポンプ場における浸水対策を実施し、施設の安全性が高まった。 ・ポンプ場における地震対策を実施し、施設の安全性が高まった。	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）		
○特記事項（今後の方針等）		
施設の持続的かつ安全な管理・運営を図るため、長寿命化対策は令和元年度から事業を実施しており、令和2年度の完了を目指す。また、未整備箇所の地震対策は、令和2年度から事業を実施し、令和5年度の完了を目指す。		

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		目標値と実績値に差が出た要因
	目標値／実績値	目標値／実績値	
1	長寿命化対策実施済みの処理場・ポンプ場における設備数 / 長寿命化対策を実施すべき処理場・ポンプ場における設備数		
	最終目標値	100%	計画どおりの予算確保が困難であった。そのため、優先度の高い事業から着手し、一部事業を次計画で実施することとしたため、目標に比べ実績が下回った。
	最終実績値	41%	
2	浸水対策（津波・高潮）実施済みの処理場・ポンプ場における設備数 / 浸水対策（津波・高潮）を実施すべき処理場・ポンプ場における設備数		
	最終目標値	100%	計画どおり整備が図られた。
	最終実績値	100%	
3	耐震化実施済みの処理場・ポンプ場の数 / 耐震化を実施すべき処理場・ポンプ場の数		
	最終目標値	80%	一部事業は、長寿命化対策事業と同調して実施する事業であり、長寿命化対策事業の一部を次計画で実施することとしたため、目標に比べ実績が下回った。
	最終実績値	40%	


社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称 1 安心・安全な公共下水道事業計画の推進（防災・安全）

計画の期間 平成26年度～平成30年度（5年間）

交付対象 田原市

田原処理区

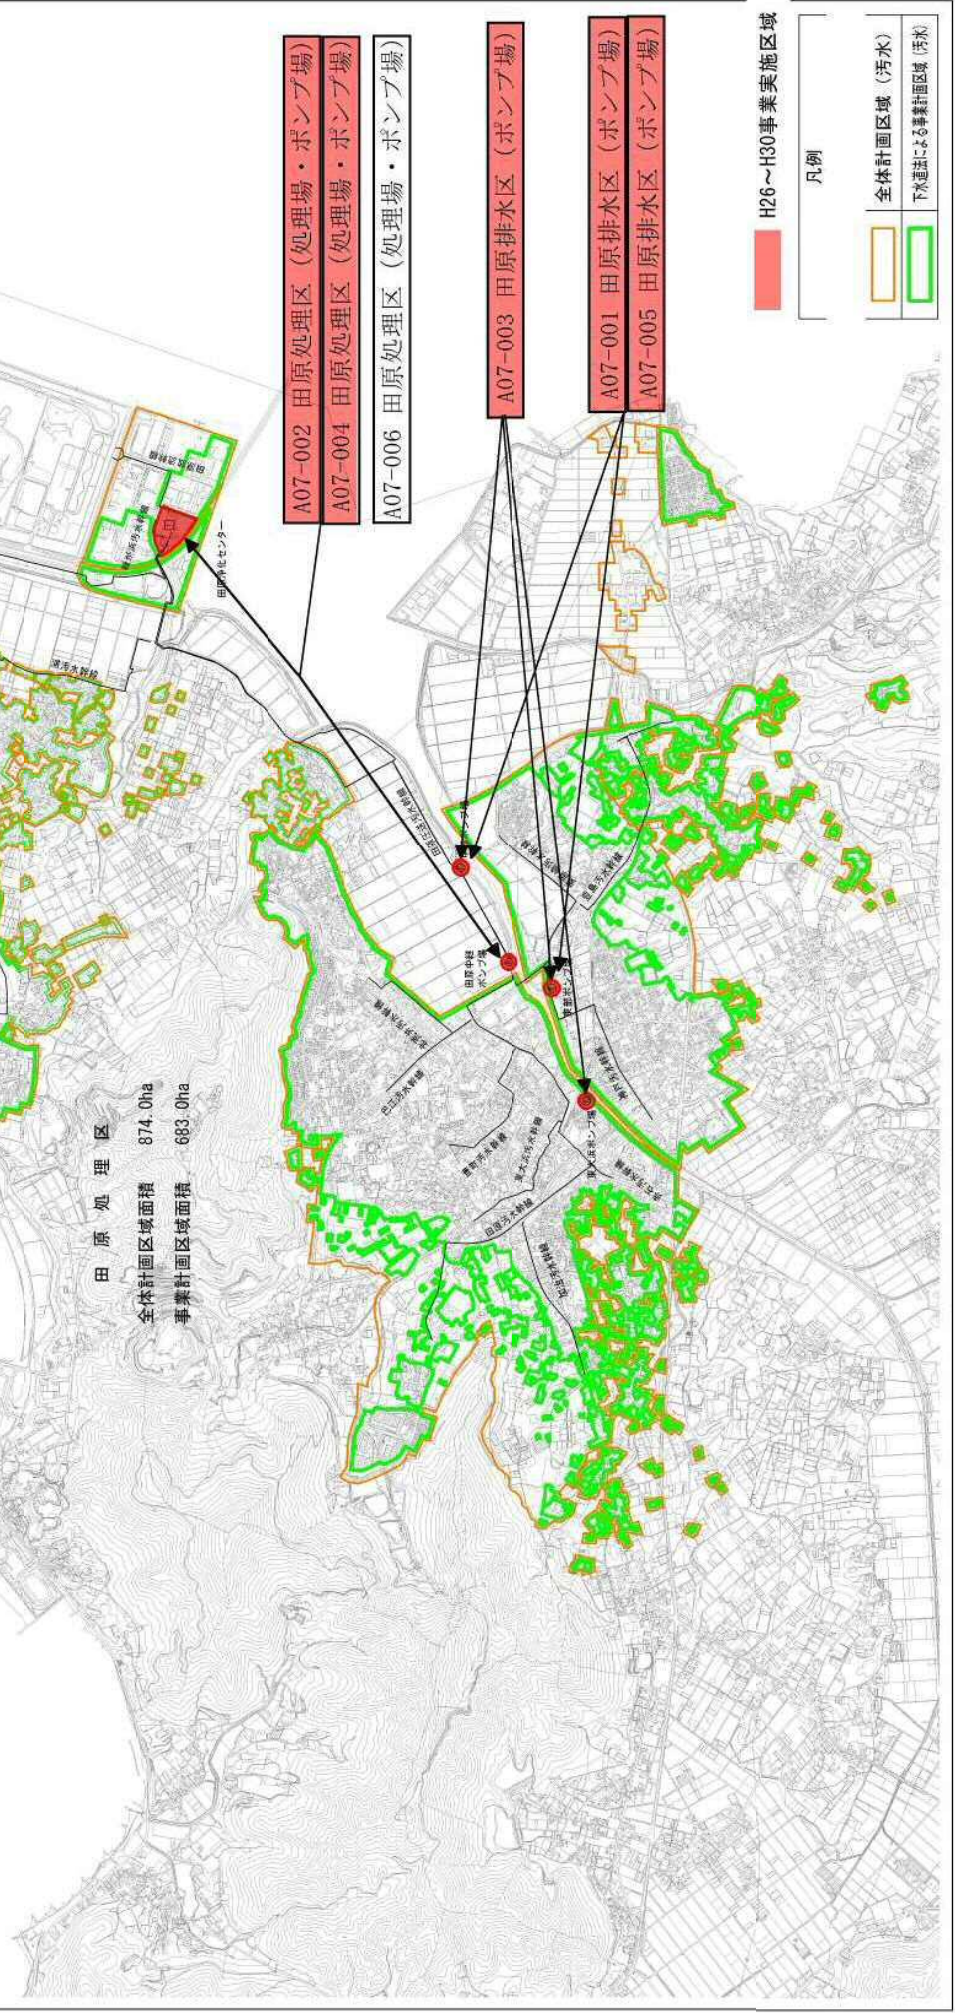

計画の名称	1 安心・安全な公共下水道事業計画の推進（防災・安全）	
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）	交付対象 田原市

平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)

A・イ
Ⅱ
Ⅲ

図 1-1
Aomori 市
Aomori 県
Aomori 県

図 1-1
Aomori 市
Aomori 県
Aomori 県

